

高速5号線シールドトンネル工事進捗状況


令和5年12月5日

【今週の作業予定】

月日	作業内容
12/4(月)	掘削
12/5(火)	掘削
12/6(水)	掘削(予定)
12/7(木)	掘削(予定)
12/8(金)	掘削(予定)
12/9(土)	掘削(予定)
12/10(日)	休工日

【進捗状況】

住宅地区間 約323m
(全体 約350m)
二葉の里から 約965m
(全体 約1,407m)

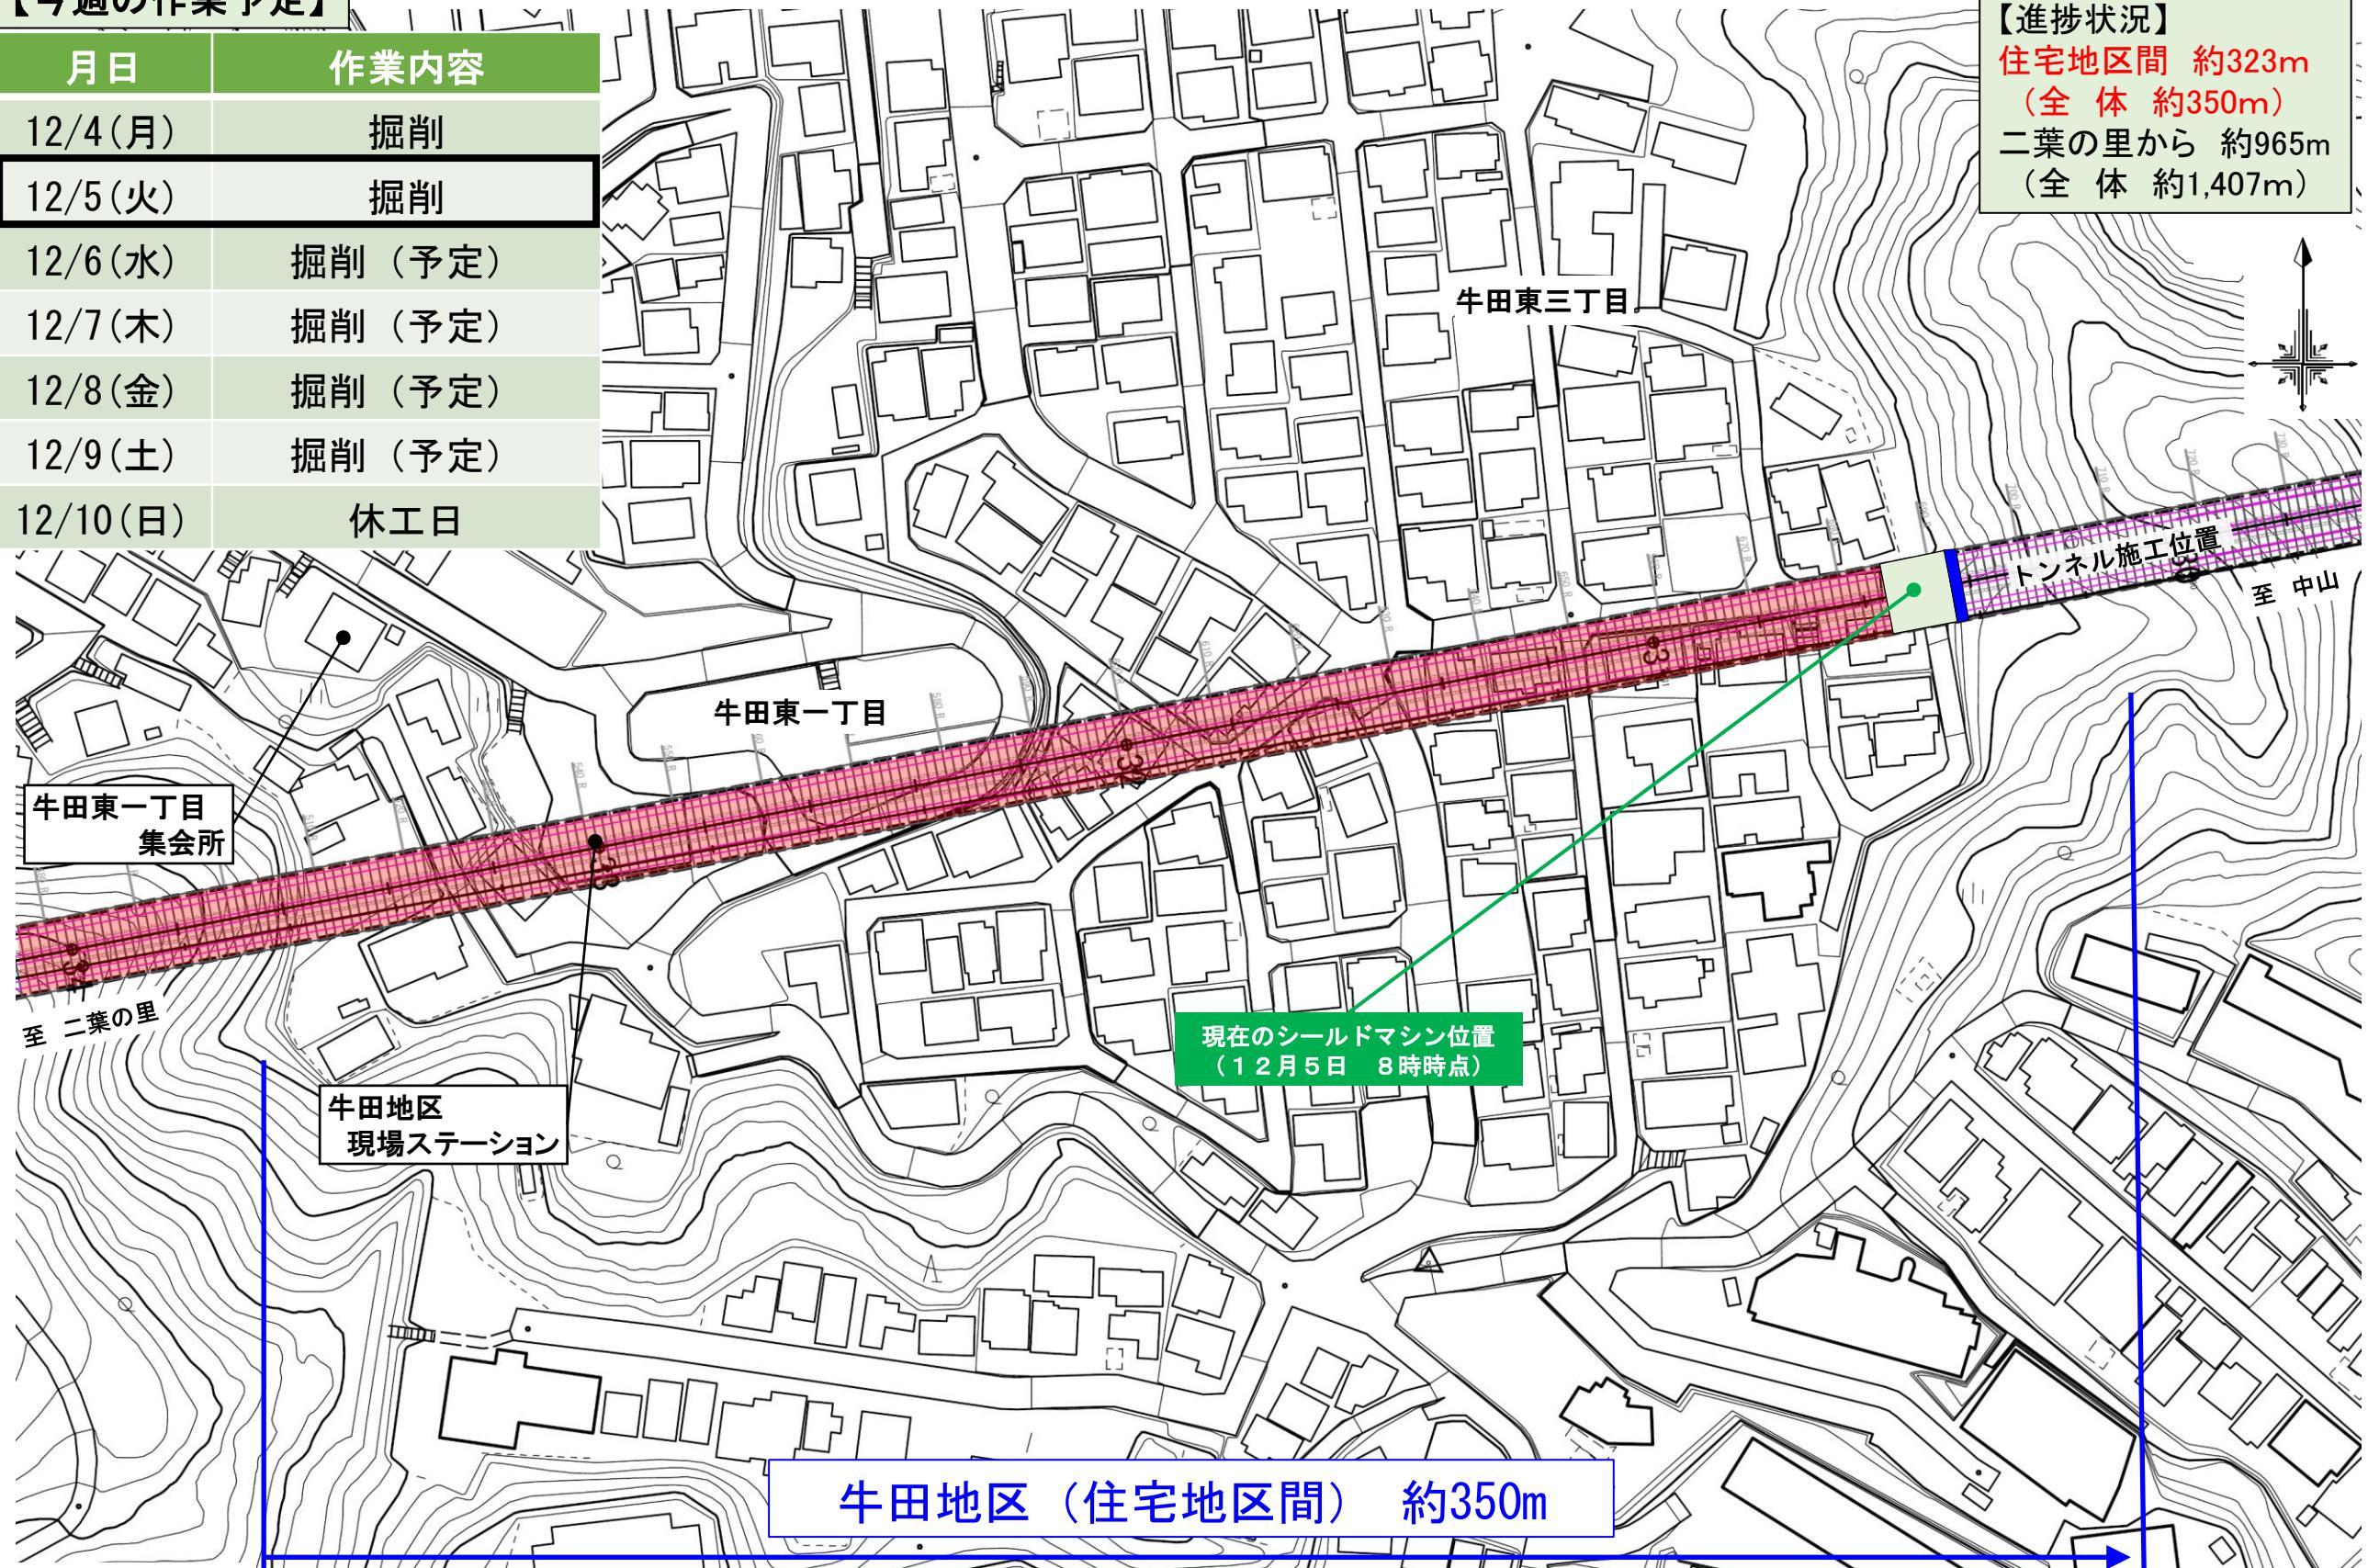

掘削済

背景図：広島県砂防基盤図を加工して作成
「令和4年広島県複製承認砂防第237号」
