

高速5号線シールドトンネル工事進捗状況


令和6年5月17日

【今週の作業予定】

月日	作業内容(予定)
5/13(月)	メンテナンス
5/14(火)	掘削
5/15(水)	掘削
5/16(木)	掘削
5/17(金)	掘削
5/18(土)	休工日
5/19(日)	休工日

【掘削状況】

トンネル施工延長 約1,075m
(全体 約1,407m)
牛田地区 約550m
(全体 約550m)
※マシンが牛田地区を通過するまで 残り5m
(シールドマシンの長さ約13m)

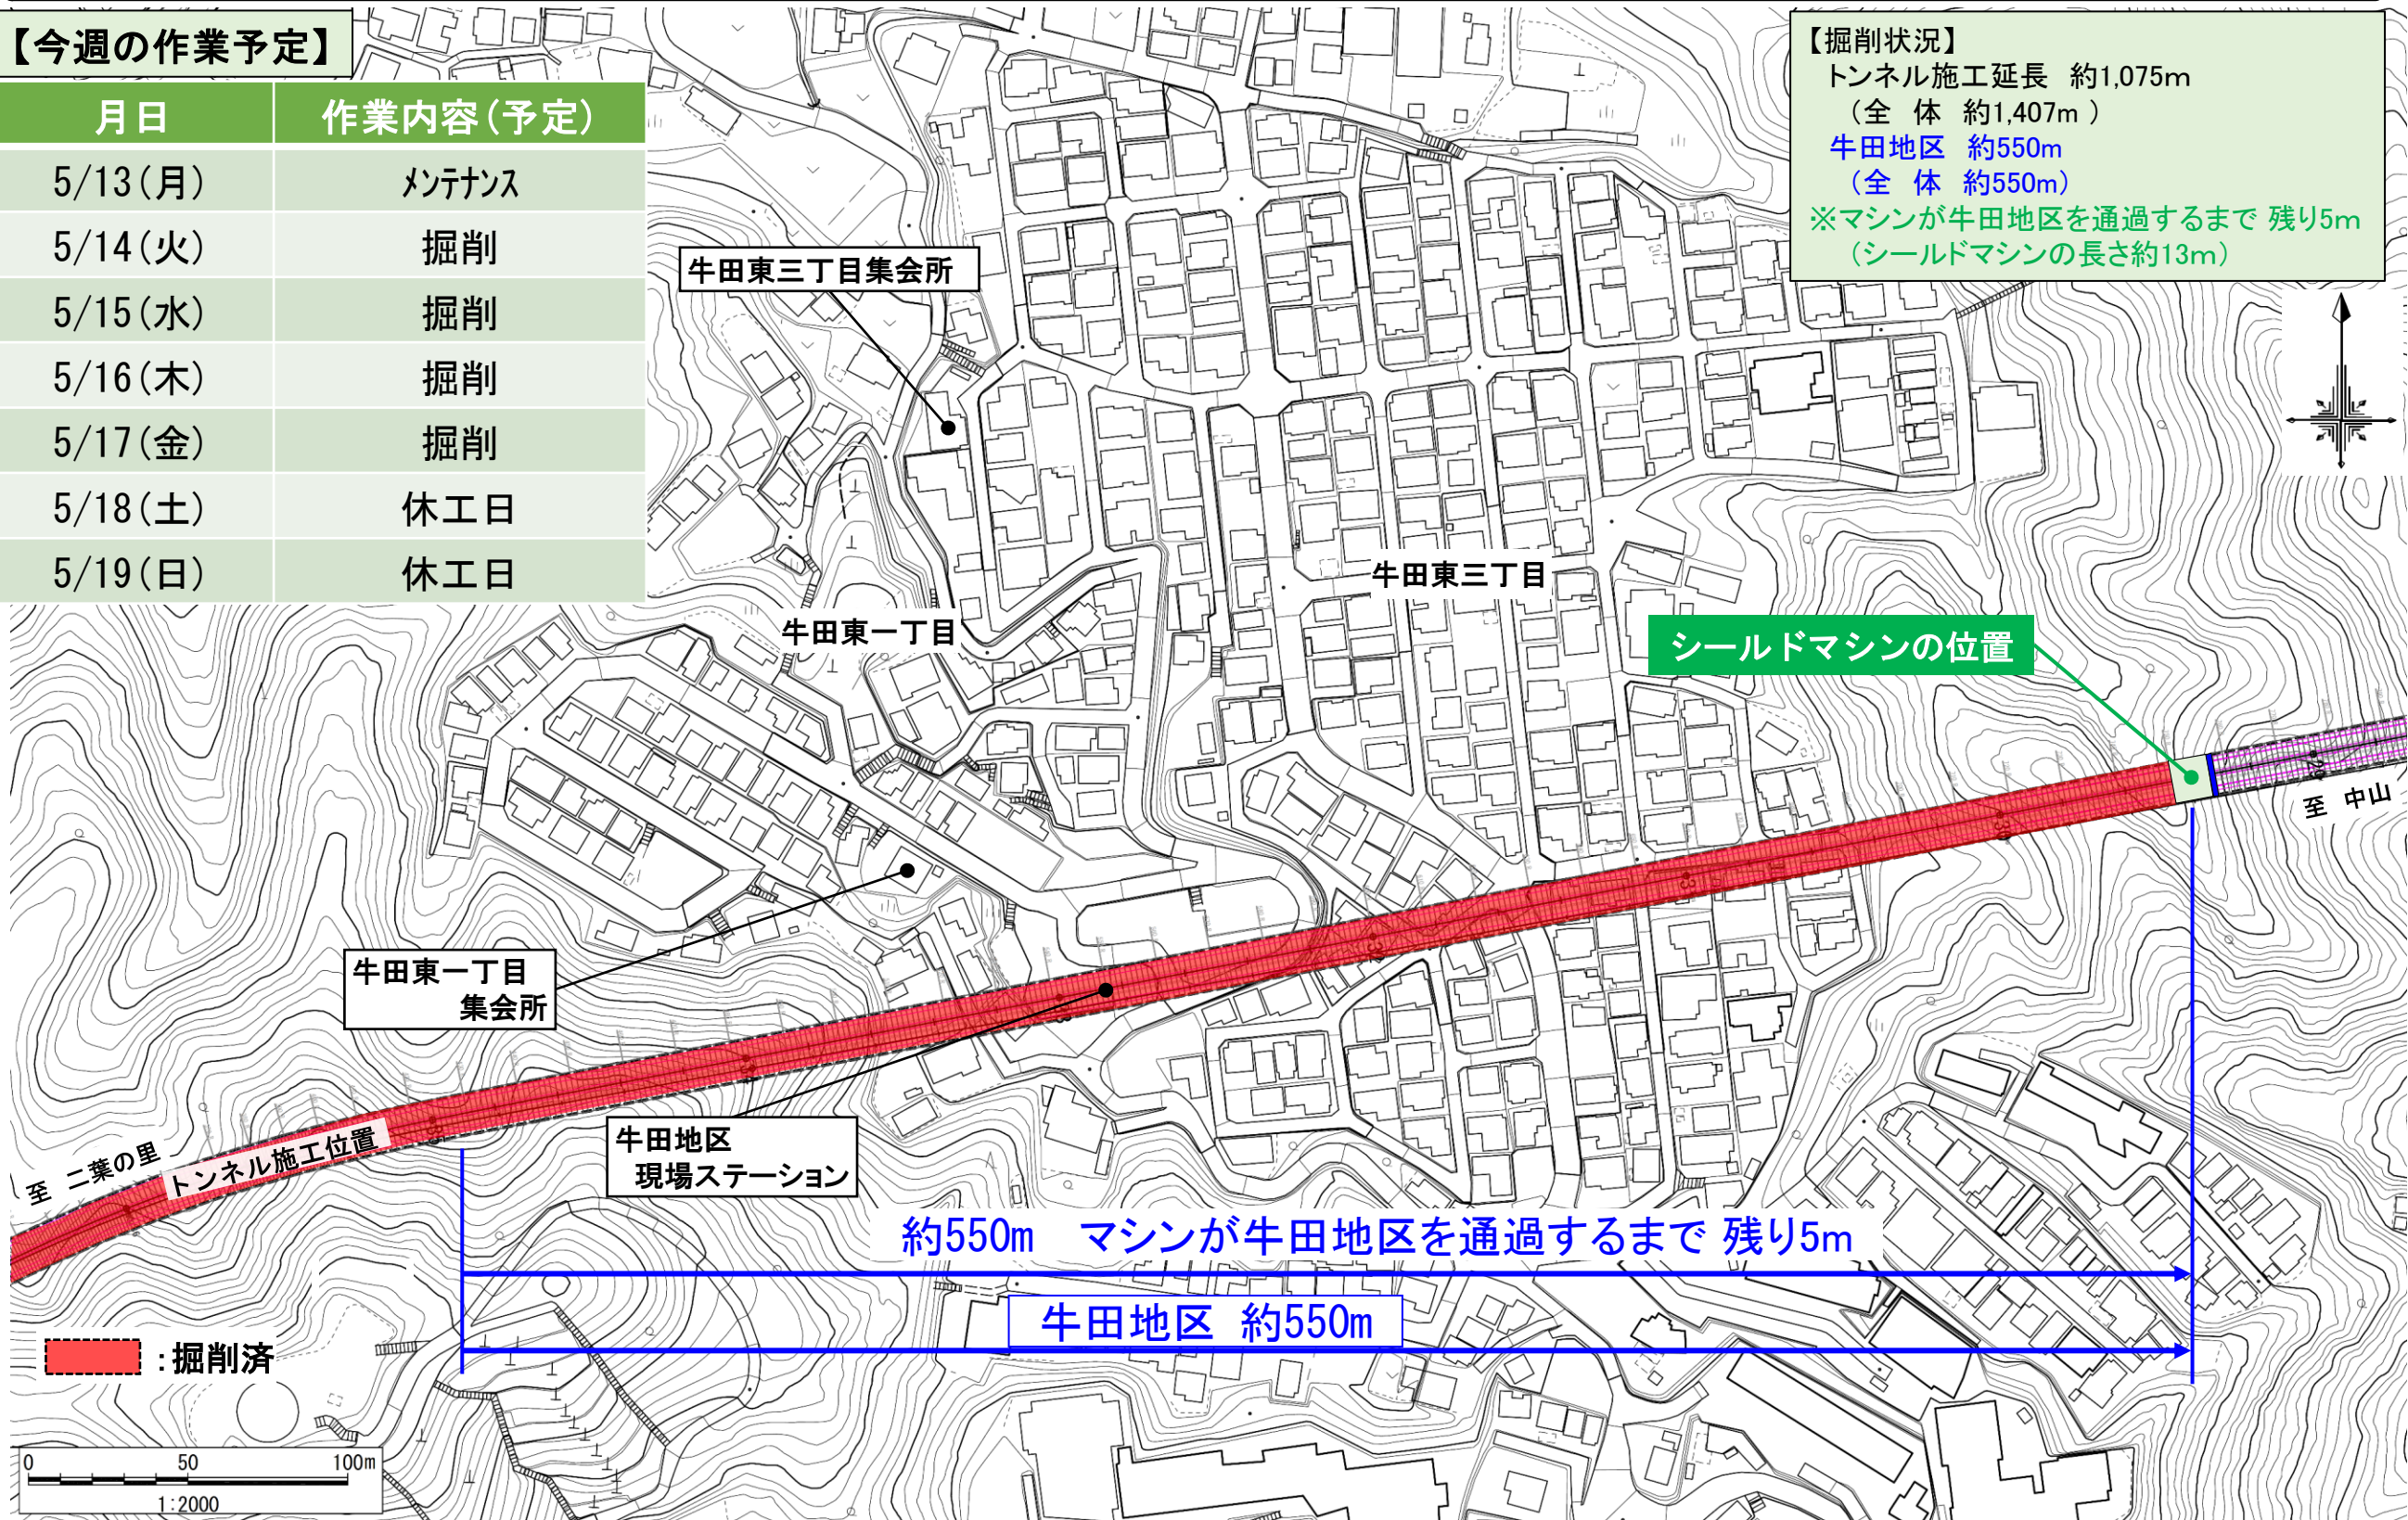

背景図：広島県砂防基盤図を加工して作成
「令和5年広島県複製承認砂防第276号」
